



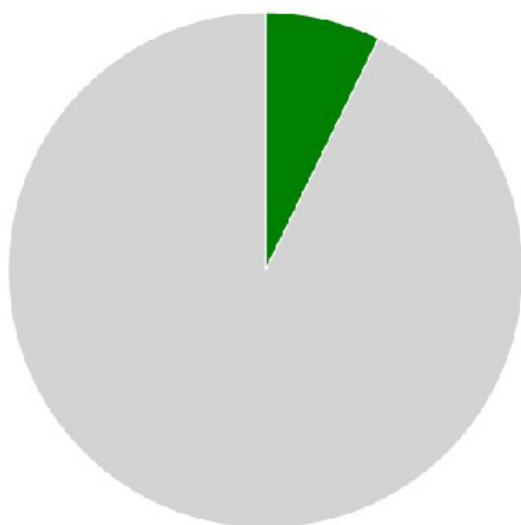

PROGRES FIZIC
DIN TOTAL PROIECT – 7,24%

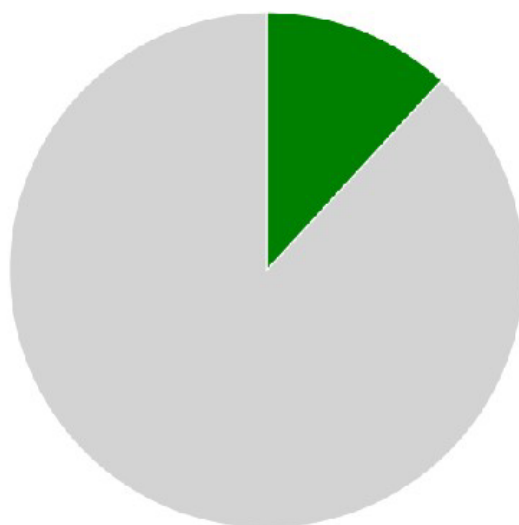

PROGRES FINANCIAR
DIN TOTAL PROIECT – 11,86%

Cod Contract	Contract	Activități realizate în perioada de raportare
Contract de tip execuție		
HD-CL-R1	Extinderea si reabilitarea rețelelor de distribuție apa potabila si a rețelelor de canalizare in orașul Brad si comunele Criscior, Ribita, Baia de Cris, Luncoiu de Jos, Baita si Valisoara	– In evaluare
HD-CL-R2	Extinderea si reabilitarea rețelelor de distribuție apa potabila si a rețelelor de canalizare in municipiul Deva si comunele Carjiti, Branisca, Ilia si Zam	– Ordin de Începere - 14.03.2025 – Contract aflat in execuție – Progres fizic 7.38% – Progres financiar 0.00%
HD-CL-R3	Extinderea si reabilitarea rețelelor de distribuție apa potabila si a rețelelor de canalizare in orașele Simeria, Geoagiu si Calan si comunele Certeju de Sus si Bretea Romana	– Ordin de Incepere - 21.02.2025 – Contract aflat in executie – Progres fizic 31% – Progres financiar 13.15%
HD-CL-R4	Extinderea si reabilitarea rețelelor de distribuție apa potabila si a rețelelor de canalizare in municipiul Hunedoara	– Ordin de Incepere -10.02.2025 – Contract aflat in executie – Progres fizic 34,25% – Progres financiar 20.98%
HD-CL-R5	Extinderea si reabilitarea rețelelor de distribuție apa potabila si a rețelelor de canalizare in orașul Hateg si comunele Santamaria Orlea, Totesti, Rachitova si Rau de Mori	– Ordin de Incepere - 17.02.2025 – Contract aflat in executie – Progres fizic 34,00% – Progres financiar 14,69%
Contracte de tip proiectare si execuție		
HD-CL-G1-A	Extindere SEAU Deva si Hunedoara	– Republicare

Cod Contract	Contract	Activități realizate în perioada de raportare
HD-CL-G1-B	Extindere si reabilitare SEAU Geoagiu si Brad, reabilitare stație de tratare Crișcior, reabilitare si extindere sursa, tratare, stație de pompare, rezervor, aducțiune Geoagiu.	– Ordin de Începere - 02.10.2024 – Contract aflat in perioada de proiectare
HD-CL-G2	Înființare si reabilitare stație de tratare, conducte de transport, stații de pompare, stații de clorinare, rezervoare in orașul Brad si comunele Crișcior, Ribita, Baia de Cris, Luncoiu de Jos, Baita si Valisoara	– Ordin de Începere - 05.09.2024 – Contract aflat in perioada de proiectare;
HD-CL-G3	Înființare si reabilitare conducte de transport, stații de pompare, stații de clorinare, rezervoare in municipiul Deva si comunele Carjiti, Branisca, Ilia, Dobra si Zam. Sursa apa in comuna Zam	– Ordin de Începere - 14.03.2025 – Contract aflat in perioada de proiectare
HD-CL-G4	Înființare si reabilitare sursa de apa, conducta de transport, stații de pompare, stații de clorinare, rezervoare in orasele Simeria, Geoagiu si comunele Harau, Certeju de Sus	– Ordin de Începere - 18.03.2025 – Contract aflat in perioada de proiectare
HD-CL-G5	Înființare si reabilitare conducte de transport, statii de pompare, stații de clorinare, rezervoare in municipiul Hunedoare si orasele Calan si Hateg si comuna Bacia	– Ordin de Începere - 08.01.2025 – Contract aflat in perioada de proiectare
HD-CL-G6	Înființare si reabilitare conducte de transport, stații de pompare, stații de clorinare, rezervoare in comunele Santamaria Orlea, Totesti, Rau de Mori, Sarmizegetuza, General Berthelot si Rachitova si infiinate retea de distributie Barastii Hategului	– Ordin de Începere - 19.05.2025 – Contract aflat in execuție – Progres fizic: 17,67% – Progres financiar: 3,46%
HD-CL-G7	Construire si dotare laborator monitorizare calitate apa si apa uzata si spatii pentru sistemul SCADA	– Ordin de Începere - 05.12.2024 – Contract aflat in perioada de proiectare
HD-CL-G8	Proiectare si execuție sistem SCADA centralizat	– In evaluare
HD-CL-G9	Proiectare si execuție sistem de contorizare digitala si reabilitare cămine de apometru	– Ordin de Începere - 17.07.2023 – Contract aflat in execuție – Progres fizic 64,38% – Progres financiar 53.15%
Contracte de furnizare		
HD-F1	Achiziția de echipamente necesare activităților de operare si întreținere a infrastructurii de alimentare cu apa si canalizare LOTUL 1.1. Utilaje pentru terasamente, utilaje de excavare si piese ale acestora	– Ordin de Începere - 24.04.2024 – In perioada ante-contract servicii supervizare au fost livrate și recepționate următoarele utilaje: ○ 1 (un) excavator ○ 7 (șapte) buldoexcavatoare – Notificare defecțiune Buldoexcavator
HD-F1	Achiziția de echipamente necesare activităților de operare si întreținere a infrastructurii de alimentare cu apa si	– Ordin de Începere - 10.02.2025 – Livrare, recepție și instructaj: ○ 1 (o) bucată Motostivuitor sarcina 2,5 tone

Cod Contract	Contract	Activități realizate în perioada de raportare
	canalizare LOTUL 1.2. Camioane macara si autobasculante	
HD-F1	Achiziția de echipamente necesare activităților de operare si întreținere a infrastructurii de alimentare cu apa si canalizare LOTUL 2. Echipamente speciale	– Ordin de Începere - 24.07.2023 – In perioada ante-contract servicii supervizare au fost livrate și recepționate următoarele echipamente: - o 4 (patru) bucăți Motopompa 4", - o 4 (patru) bucăți Motopompa 3", - o 2 (două) bucăți Autoutilitare curățare si spălare cu presiune 10 mc, - o 7 (șapte) bucăți Autovidanje, - o 2 (două) bucăți Autolaborator inspecție video CCTV, - o 1 (o) bucată Autolaborator apa potabila, - o 1 (o) bucată Autolaborator apa uzata, - o (șase) bucăți Atelier mecanic mobil, - o 1 (o) bucată Autolaborator detectări pierderi.
